

新自治会館工事

2022年 東自治会

解体



6月16日に解体が始まり、24日には更地になりました。

基礎工事1



7月9日 縄張り。



8月11日 地盤補強用鉄パイプが3尺間隔で多数打ち込まれました。




足場用と同サイズのφ48です。

基礎工事2



8月21日基礎部削り 生コン流した後 基礎外枠設置
25日配筋開始 D13鉄筋を縦横に15,6cm間隔で

基礎工事3

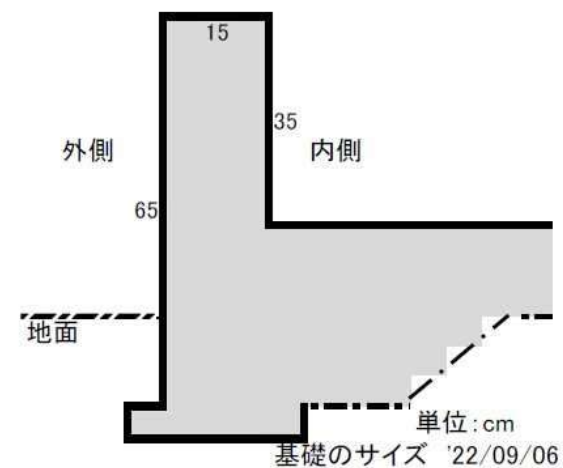

基礎断面図

- 9月4日 基盤面に30cm程度生コン流し、その上に基礎内外の型枠設置
- 6日 基礎部35cmの高さに生コン。
- 10日 型枠が外され基礎工事完了。(地盤対策のせい? 予定から2ヶ月遅れ)
